

1. What is a project?

- A project is a short-term task with a clear goal.
- It has a set start and end time.
- Resources are used to complete the task.

প্রকল্প কি?

- প্রকল্প হলো একটি অস্থায়ী কাজ যার স্পষ্ট লক্ষ্য থাকে।
 - এর শুরু ও শেষ সময় নির্দিষ্ট থাকে।
 - কাজটি শেষ করতে সম্পদ ব্যবহার করা হয়।
-

2. Major cause of project failure

- Poor communication.
- Bad management of time, money, and people.
- Unclear goals and poor planning.

প্রকল্প ব্যর্থতার প্রধান কারণ

- দুর্বল যোগাযোগ।
 - সময়, টাকা, ও কর্মী ব্যবস্থাপনায় সমস্যা।
 - অস্পষ্ট লক্ষ্য ও খারাপ পরিকল্পনা।
-

3. Difference between scope creep and feature creep

- **Scope creep:** Project's goal grows without more time or resources.
- **Feature creep:** New features are added to the project that weren't in the plan.

স্কোপ ক্রিপ এবং ফিচার ক্রিপের পার্থক্য

- **স্কোপ ক্রিপ:** প্রকল্পের লক্ষ্য বেড়ে যায় কিন্তু অতিরিক্ত সময় বা সম্পদ দেওয়া হয় না।
 - **ফিচার ক্রিপ:** নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয় যা পরিকল্পনায় ছিল না।
-

4. Five main competencies for a project manager

1. **Leadership:** Lead and motivate the team.
2. **Technical:** Understand the project work.
3. **Strategic:** Know business goals.
4. **Communication:** Share information clearly.
5. **Relationship Management:** Build strong relationships with others.

প্রকল্প ব্যবস্থাপককে ৫টি মূল দক্ষতা

1. **নেতৃত্ব:** দলকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা।
 2. **প্রযুক্তিগত:** প্রকল্পের কাজ বোঝা।
 3. **কৌশলগত:** ব্যবসায়িক লক্ষ্য জানানো।
 4. **যোগাযোগ:** স্পষ্টভাবে তথ্য ভাগ করা।
 5. **সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা:** অন্যদের সাথে সম্পর্ক গঠন করা।
-

5. Why are business achievement competencies important?

- Help understand business goals.
- Ensure project work aligns with company needs.

ব্যবসায়িক অর্জন দক্ষতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- ব্যবসায়িক লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করে।
- প্রকল্পের কাজ সংস্থার প্রয়োজনের সাথে মেলে।

6. What are the basic project management functions?

1. **Initiating:** Start the project and get approval.
2. **Planning:** Make a detailed plan for the project.
3. **Executing:** Carry out the plan and do the tasks.
4. **Monitoring and Controlling:** Track progress, find problems, and fix them.
5. **Closing:** Finish the project and get approval from stakeholders.

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যক্রম:

1. **শুরু করা:** প্রকল্প শুরু করা এবং অনুমোদন নেওয়া।
 2. **পরিকল্পনা:** প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা।
 3. **বাস্তবায়ন:** পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং কাজগুলি সম্পন্ন করা।
 4. **মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ:** অগ্রগতি ট্র্যাক করা, সমস্যা চিহ্নিত করা, এবং সমাধান করা।
 5. **সমাপ্তি:** প্রকল্প শেষ করা এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া।
-

7. What are PERT and Gantt charts? How do we decide which one to use?

- **PERT chart:** Shows task sequence and dependencies using a network diagram. Good for complex projects with many interdependent tasks.
- **Gantt chart:** Shows start and end dates of tasks using bars. Better for simpler projects with fewer dependencies.

PERT এবং Gantt চার্ট কি? কিভাবে জানব কোনটা ব্যবহার করবো?

- **PERT চার্ট:** কাজগুলোর সিকোয়েন্স এবং নির্ভরতা দেখায় একটি নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে। এটি জটিল প্রকল্পের জন্য ভালো, যেখানে অনেক আন্তঃনির্ভরশীল কাজ থাকে।
- **Gantt চার্ট:** কাজের শুরু এবং শেষ তারিখ বার দ্বারা দেখায়। এটি সহজ প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত যেখানে কম নির্ভরশীলতা থাকে।

8. What are the eight major activities in the project management life cycle?

Scope Fixing – প্রজেক্টে কী থাকবে সেটা ঠিক করা।
Task Breaking – কাজগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা।
Time Estimation – প্রতিটি কাজ কত সময় লাগবে সেটা হিসেব করা।
Task Linking – কোন কাজ আগে, কোনটা পরে সেটা ঠিক করা।
Resource Setting – মানুষ, টাকা, যন্ত্রপাতি ঠিকভাবে বরাদ্দ করা।
Team Guiding – টিমকে কাজের দিকনির্দেশনা দেওয়া।
Progress Checking – কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা দেখা।
Project Review – প্রজেক্ট শেষে কী শেখা গেল, সেটা দেখা।

2. কাজগুলি চিহ্নিত করা।
3. কাজের সময়কাল অনুমান করা।
4. কাজের নির্ভরতা নির্দিষ্ট করা।
5. সম্পদ বরাদ্দ করা।
6. দলের কাজ পরিচালনা করা।
7. অগ্রগতি মনিটর এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
8. প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন করা।

9. Why is negotiating scope important? What is the deliverable in the process of negotiating the scope?

- **Why it's important:** Ensures everyone understands the project's goals and prevents scope creep (when the project expands beyond its original goals).
- **Deliverable:** A clear and agreed project scope statement.

স্কোপ আলোচনা কেন গুরুত্বপূর্ণ? স্কোপ আলোচনা প্রক্রিয়াতে কী ফলাফল পাওয়া যায়?

- **কেন গুরুত্বপূর্ণ:** এটি নিশ্চিত করে যে সবাই প্রকল্পের লক্ষ্য বুঝে এবং স্কোপ ক্রিপ (যখন প্রকল্পটি মূল লক্ষ্য ছাড়িয়ে যায়) প্রতিরোধ করা হয়।

- **ফলাফল:** একটি স্পষ্ট এবং সম্মত প্রকল্প স্কেপ বিবৃতি।
-

10. What is a popular tool used to identify tasks in the project management life cycle?

- **Work Breakdown Structure (WBS):** Breaks down the project into smaller, manageable parts and tasks.

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জীবনে কাজগুলি চিহ্নিত করার জন্য জনপ্রিয় টুল কী?

- **ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার (WBS):** প্রকল্পটিকে ছোট, পরিচালনাযোগ্য অংশ এবং কাজগুলিতে ভাগ করে।

11. What are the factors to consider in estimating task durations?

1. **Task Difficulty:** How hard is the task?
2. **Team Skills:** How good is the team at doing the task?
3. **Resources Available:** Are the tools and materials available?
4. **Effort Needed:** How much work is needed to finish the task?
5. **Risk:** Is there anything that could cause delay?

কাজের সময়কাল অনুমান করার সময় কি কি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে?

1. **কাজের কঠিনতা:** কাজটি কতটা কঠিন?
 2. **দলের দক্ষতা:** দলটি কাজটি কত ভালোভাবে করতে পারে?
 3. **সম্পদ প্রাপ্যতা:** উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি পাওয়া যাচ্ছে কি?
 4. **চেষ্টা:** কাজটি শেষ করতে কতটুকু পরিশ্রম লাগবে?
 5. **ঝুঁকি:** কাজটি দেরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?
-

12. What are the differences between forward scheduling and reverse scheduling?

- **Forward Scheduling:** Start the project now and plan tasks step by step.
- **Reverse Scheduling:** Set the project deadline first and plan tasks from the end.

ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স স্কেজুলিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

- **ফরওয়ার্ড স্কেজুলিং:** প্রকল্প শুরু থেকেই কাজগুলো পরিকল্পনা করুন।
- **রিভার্স স্কেজুলিং:** প্রথমে প্রকল্পের শেষ সময় নির্ধারণ করুন, তারপর কাজগুলো পরিকল্পনা করুন।

13. What are the categories of resources to be allocated to the project?

1. **People:** Team members working on the project.
2. **Materials:** Tools, equipment, and space needed for the project.
3. **Money:** Budget or funds for the project.

প্রকল্পে কোন ধরনের সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে?

1. **মানুষ:** প্রকল্পে কাজ করা দল।
2. **উপকরণ:** যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং সাইট।
3. **পয়সা:** প্রকল্পের জন্য অর্থ।

14. What should project managers do to manage changes during a project?

- **Create a process:** Have clear steps to handle changes.
- **Approve changes:** Check and approve changes.
- **Communicate:** Keep everyone updated about changes.

প্রকল্প ব্যবস্থাপকরা প্রকল্প চলাকালীন পরিবর্তনগুলো কীভাবে পরিচালনা করবেন?

- **একটি প্রক্রিয়া তৈরি করুন:** পরিবর্তনগুলোর জন্য স্পষ্ট পদক্ষেপ রাখুন।
- **পরিবর্তন অনুমোদন করুন:** পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করে অনুমোদন করুন।
- **যোগাযোগ করুন:** সবাইকে পরিবর্তন সম্পর্কে জানিয়ে রাখুন।

15. Why is critical path analysis important?


It shows which tasks are the most important.
If these tasks are delayed, the whole project gets delayed.
It helps save time.
It makes planning easier.
It helps find possible problems early.

✅ Gantt Chart (Text Format - Easy)

Your project started on **September 1** and will end on **June 30**. That's **10 months**. Now it's **April 1**, so 7 months have passed. The project is **1 week behind**.

You are using the **FAST method**, so project parts can happen at the same time.

Here's a simple Gantt chart showing project steps month by month:

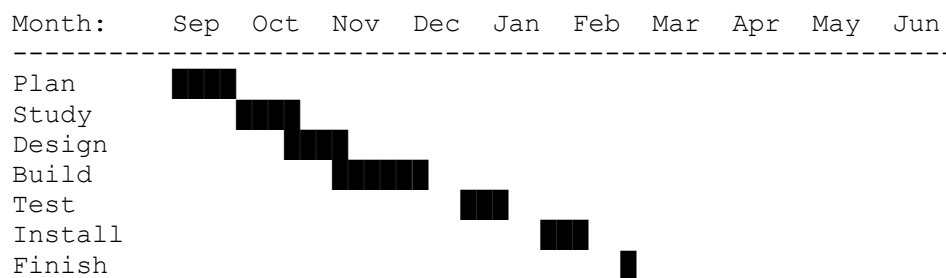

➡ Now it's April. You are in the **Build (Construction)** step but **1 week late**.

✅ What to do if someone has too much work?

You see that one team member has more work than they can do.

What can you do?

👉 Use **Resource Leveling**.

What is it?

It means:

- **Change some task dates** so the person has enough time.
- **Don't give too many tasks at the same time.**

Other simple ways to fix:

1. **Give some work to other team members**
2. **Move some tasks to a later time**
3. **Add more help** if possible
